

武雄市 橋梁長寿命化修繕計画



令和8年9月

武雄市

目 次

	頁
1. 長寿命化修繕計画の目的-----	1
(1) 背景-----	1
(2) 目的-----	1
2. 道路橋梁の現状と課題-----	2
(1) 武雄市における橋梁の概要-----	2
(2) 橋梁の現状と課題-----	3
3. 道路橋梁施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方-----	5
(1) 健全度の把握に関する基本的な方針-----	5
(2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針-----	6
4. 具体的な補修事例-----	7
5. 橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針---	8
(1) 費用の縮減に関する基本的な方針-----	8
(2) 新技術等の活用方針-----	8
(3) 橋梁の集約・撤去-----	8
(4) 直営点検-----	8
6. 点検及び修繕計画の期間-----	9
(1) 点検時期-----	9
(2) 橋梁の修繕内容及び時期-----	9
7. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期-----	10
8. 長寿命化修繕計画による効果-----	21


1.長寿命化修繕計画の目的

(1)背景

本市が管理する橋梁は、令和8年度現在で542橋架設されています(うち、道路附属物※1 1橋)。
このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全体の27%を占めており、20年後の令和26年には91%程度に増加します。

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の事後保全型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念されます。

※1:武雄競輪場入口歩道橋

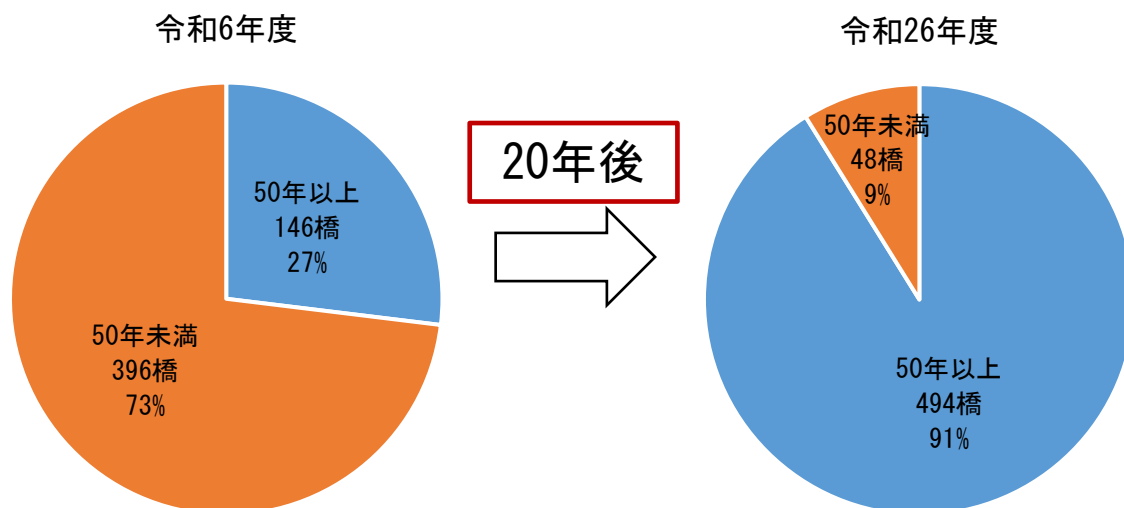


※架設年度不明の橋梁は、40～49年程度と想定する

(2)目的


このような背景から、より計画的な維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取組みが不可欠となります。

コスト削減のためには、従来型の事後保全型維持管理から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型維持管理へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要があります。

そこで本市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。

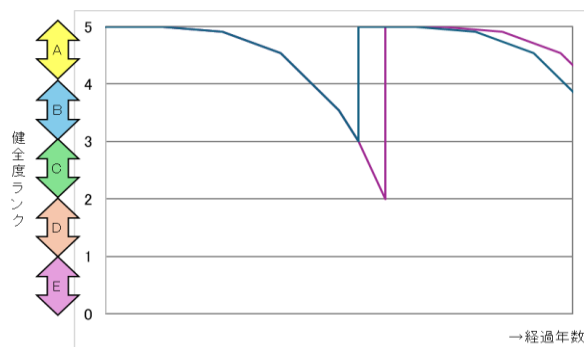

予防保全型BまたはC
健全度ランクがBランクの末期(3点)
またはCランクの末期(2点)に達したら
対策を行う

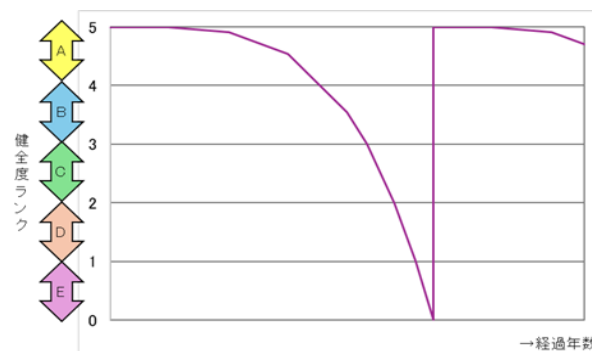


事後保全型
健全度ランクがEランクの
末期(0点)に達したら対策を行う

2.道路橋梁の現状と課題

(1)武雄市における橋梁の概要

武雄市が管理する橋梁は542橋。橋長15m未満の橋梁は448橋、15m以上の橋梁は94橋となっています。

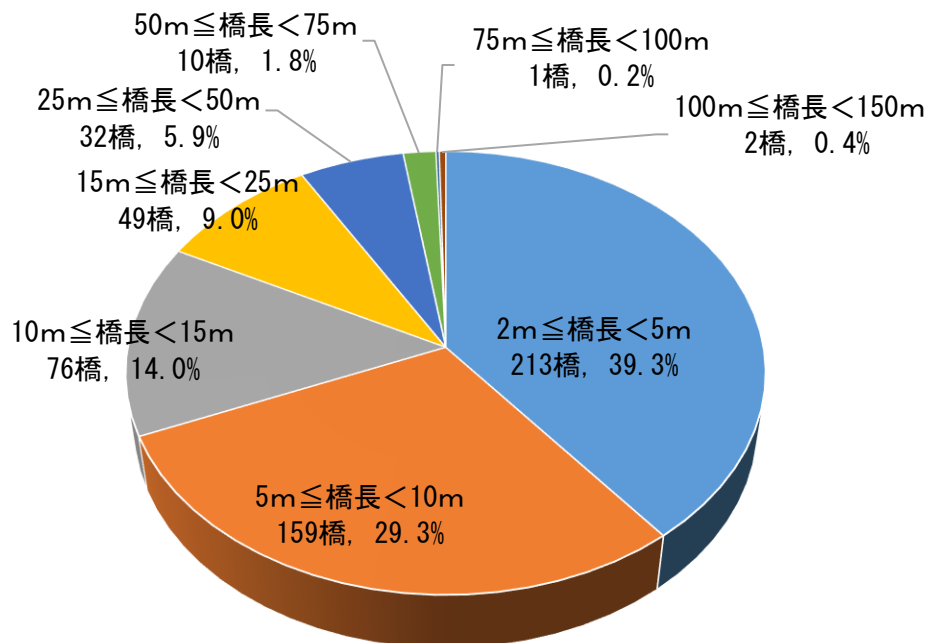


橋長別の橋数(割合)

全橋の種別は、R C 橋が333橋(62%)、P C 橋が186橋(34%)、鋼橋が18橋(3%)、その他が5橋(1%)となっています。

R C 橋：コンクリートと鉄筋を組み合わせ、強度や耐久性を向上させた構造形式

P C 橋：コンクリート内部に埋め込んだ鋼材に予め圧縮応力をかけることで、強度や耐久性を向上させた構造形式

その他：石橋など

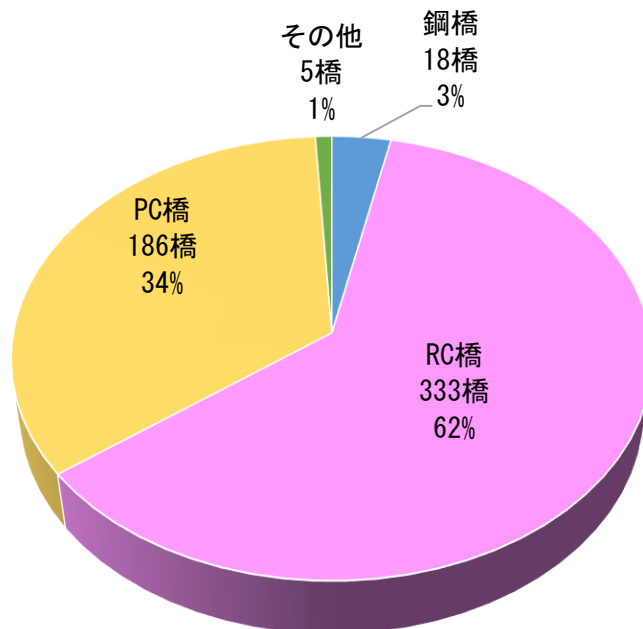


橋種別の橋数(割合)

(2) 橋梁の現状と課題

武雄市が管理する供用中の道路における橋梁は、令和8年3月現在542橋であり、建設後50年を超える橋梁数は現在146橋ですが、10年後には394橋、20年後には494橋となり、高齢化が急速に進んでいく状況となっています。


さらに、円滑な交通を確保できず、第三者被害などの事象も想定されるため、定期点検による確実な道路橋梁の状態把握(早期発見)、点検結果に基づく確実な対策(早期補修)が必要となっています。

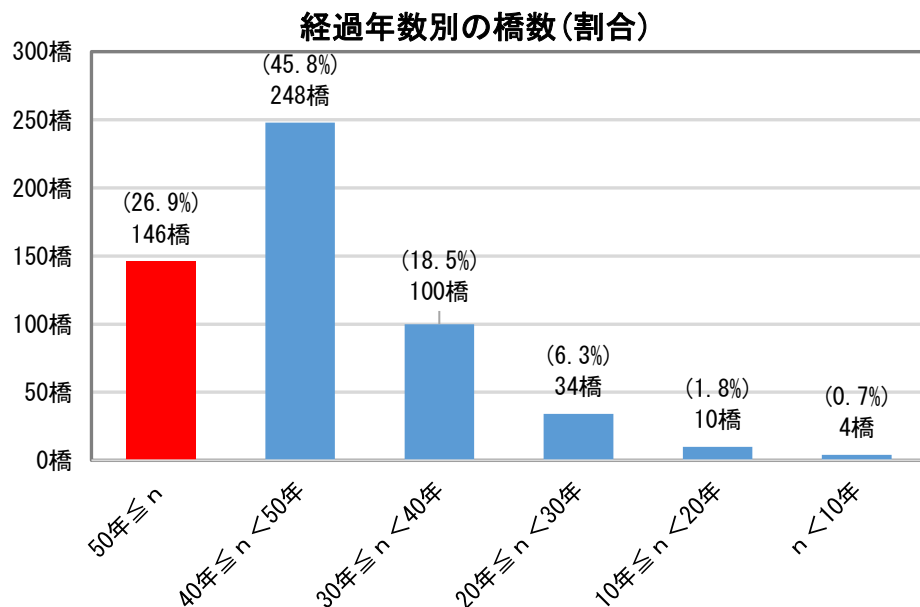


※架設年度不明の橋梁は、40～49年程度と想定する



20年後

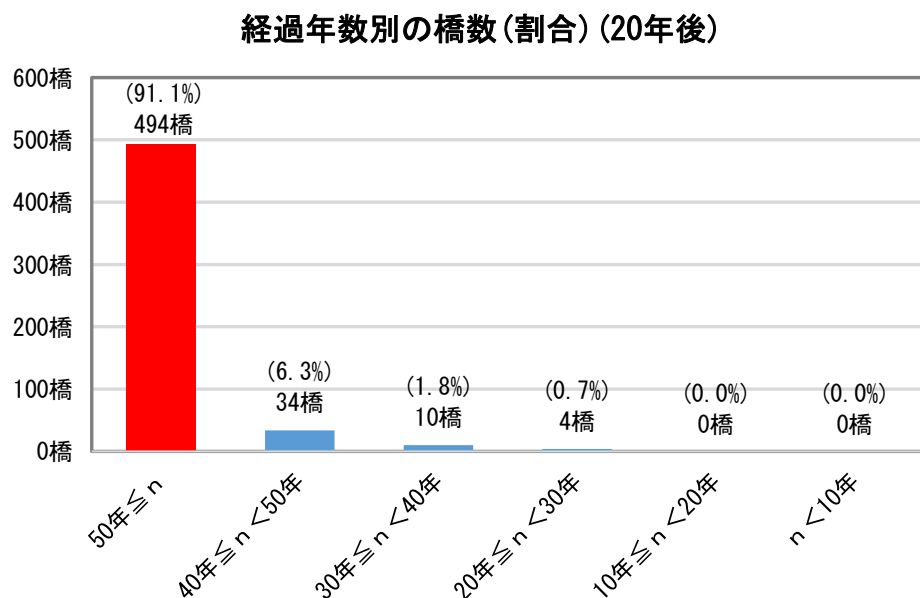

全橋梁の健全度割合はⅠが239橋(44.1%),Ⅱが287橋(53.0%),Ⅲが16橋(3.0%),Ⅳが0橋(0%)です。補修した橋梁は施工後の健全度を適用しています。(令和8年3月時点までのデータ)

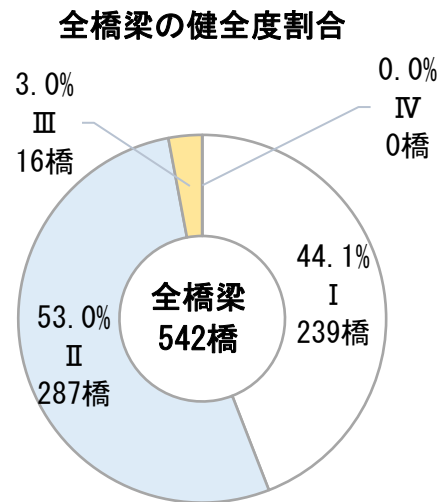

区 分		状 態
Ⅰ	健 全	構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい 状態
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、 早急に措置を講ずべき状態 → 次回点検までを目安に措置
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、または生じる 可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 → 応急措置を実施(必要に応じて通行規制)

3.道路橋梁施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

(1)健全度の把握に関する基本的な方針

計画的かつ予防的な対応を行っていくためには、点検により橋梁の状態を把握し、その結果を踏まえて健全度を評価することが重要となります。そのため、「道路橋定期点検要領（平成31年2月国土交通省道路局）」（以下、「定期点検要領」という。）に基づき、5年に1回の頻度で定期点検を継続して実施し、橋梁の損傷状況を早期に把握します。また、定期点検の結果に基づく健全性の診断結果（健全度）を長寿命化修繕計画に反映させていきます。

区 分		状 態
I	健 全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい 状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、 早急に措置を講ずべき状態 → 次回点検までを目安に措置
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、または生じる 可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 → 応急措置を実施(必要に応じて通行規制)



橋梁点検車による定期点検



定期点検(打音検査)状況

(2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋梁上に堆積した土砂撤去や排水柵の清掃等の損傷要因の除去を目的とした日常的な対応を行っていくことが、損傷の進行の予防につながり、橋梁を良好な状態に保つことができます。したがって、橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パトロールや清掃などを継続的に実施していきます。橋梁上の舗装の段差や排水施設の支障箇所など、比較的対応が容易な損傷については、日常の維持作業により措置します。また、地震等の災害が発生した場合、若しくは予期せぬ異常が発見された場合には、異常時点検を実施し、橋梁の安全性を確認します。

4.具体的な補修事例

代表的な損傷例と補修例

定期的な点検により、早期に損傷を発見し、損傷が深刻化する前に対策を実施しています。



鋼桁の腐食



RC床版橋の鉄筋露出



RCT桁のうき

代表的な定期点検例



橋梁点検車による点検状況



ボートによる点検状況



石橋の点検状況

5.橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

(1)費用の縮減に関する基本的な方針

これまでに進めてきた計画的かつ予防的な維持管理を更に推進することで、橋梁の健全度を良好な状態に維持し長寿命化すると共に、修繕・架替えに係る費用を抑え、ライフサイクルコスト（LCC）の縮減ならびに予算の平準化を図ります。管理橋梁数が542橋と多いため、維持管理の区分は、各橋梁の特性に合わせて「予防保全型B」、「予防保全型C」、「事後保全型」の3つに分類しました。また、予算の平準化にあたっては、定期点検結果による「橋梁の健全度」と橋梁諸元や架橋状況などによる「橋梁の重要度」を考慮して対策の優先順位を決定し、対策時期の調整を行います。ここで、橋梁の重要度を評価する項目は、判定区分・重要橋梁・橋長・迂回路・桁下状況・利用状況・路線種別・バス路線の8項目としました。

(2)新技術等の活用方針

社会インフラの老朽化対策を効率的に進めていくため、近年、維持管理に係る技術開発が積極的に行われています。橋梁の維持管理においても、定期点検の効率化や高度化を図る点検支援技術や補修工事の省力化、コスト縮減を図るための補修工法など、新技術・新工法が開発されています。本市では新技術についての情報収集を継続し、令和16年度までの10年間で管理橋梁数542橋の10%程度で新技術の活用を検討し、200万円のコスト縮減を目指します。

(3)橋梁の集約・撤去

本市が管理する橋梁数は542橋と多く、高齢化も進んでいるため、今後老朽化対策に必要な維持管理コストの増大が見込まれます。限られた予算の中で持続可能な維持管理を行っていくためには、維持管理コスト縮減の観点より将来的に橋梁の集約化や撤去を検討していく必要があります。令和8年度以降、管理する542橋の全てについて、定期点検で健全度ⅢまたはⅣと判定された橋梁、利用状況、迂回路を勘案し、集約・撤去の有効性の有無について検討します。検討の結果、有効と考えられ、地元の了解が得られた場合は、ダウンサイジングを含めた集約・撤去を行うことで維持管理費の縮減を図ります。

令和16年度までの10年間で、管理橋梁数542橋のうち1%程度の橋梁について、地域の実情や利用状況に応じて集約・撤去を検討し、2,000万円のコスト縮減を目指します。

(4)直営点検

定期点検について費用の縮減を図ります。前回点検での判定が健全度Ⅰの橋梁について、年間数橋の職員による直営点検を実施、費用縮減に努めます。

6.点検及び修繕計画の期間

(1)点検時期

本市では、長寿命化修繕計画で対象とした542橋すべてについて、橋梁の健全度を把握するための定期点検要領に基づき、5年に1回の頻度で近接目視による定期点検を実施します。

定期点検は、全542橋を5ヶ年に分割して実施します。

(2)橋梁の修繕内容及び時期

定期点検により把握した損傷状況から現時点での健全度を評価し、また、今後どのように橋梁の劣化が進行していくかを予測することにより、適切な修繕内容・実施時期について計画を行いました。今後はこの計画に基づいて修繕を実施するとともに、定期点検及び修繕工事を行うすべての橋梁に対し、新技術等の活用を検討します。

令和7年度(2025)以降、10年間の概ねの点検時期及び修繕時期を、以下に添付した「修繕計画表(10年間)」に示します。

橋梁名	点検計画									
	R7年	R8年	R9年	R10年	R11年	R12年	R13年	R14年	R15年	R16年
〇〇橋	点検	点検結果に応じ 補修		点検	点検					点検
□□橋	点検	点検結果に応じ 補修			点検	点検				
△△橋	点検	点検				点検	点検			

※実施にあたっては、社会情勢の変化や計画の進捗状況に合わせ、必要に応じて随時見直しを行いながら進めていきます。

7.対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

○：点検 ◎：設計 ●：工事

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	構造 形式	最新 点検 年次	架設 年度	補修費 (万円)	主な対策内容	対策の内容・時期											
										2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)		
T001	第一測の尾橋	市道測ノ尾内田線	19.0	7.7	PC橋	2021	2008									○					
T002	第二測ノ尾橋	市道測ノ尾内田線	3.9	6.4	RC橋	2021	1980									○					
T003	西山橋	市道西山線	12.2	12.5	PC橋	2020	1997			○						○					
T004	第二女学校橋	市道女学校線	7.0	6.2	PC橋	2021	1996				○						○				
T006	天神崎白岩橋	市道天神崎白岩線	5.1	25.0	RC橋	2021	1970	4,015	BOX更新等			○					○	◎	●		
T007	白岩大橋	市道天神崎白岩線	43.2	16.8	PC橋	2021	1984	12,240	ひびわれ注入工、断面修復工等			○		◎	●	●	●	●	●		
T008	西浦天神崎橋	市道西浦天神崎線	5.2	17.0	RC橋	2021	1971					○					○				
T014	木下橋	市道鳴瀬花島線	2.0	11.0	RC橋	2021	1985					○					○				
T015	下山第1橋	市道下山線	4.7	5.4	RC橋	2021	1969					○					○				
T016	下山第2橋	市道下山線	5.0	6.8	RC橋	2021	1971	595	ひびわれ注入工等			●					○				
T017	下山第3橋	市道下山線	5.1	5.6	RC橋	2021	1982					○					○				
T018	枯木ノ塔橋	市道枯木ノ塔線	4.4	5.6	RC橋	2021	1967					○					○				
T019	池の内橋	市道池ノ内線	3.1	6.5	RC橋	2023	1977							○					○		
T020	竜見崎橋	市道花島大日線	2.4	4.6	RC橋	2021	不明					○					○				
T023	下山第5橋	市道大谷線	3.8	4.4	RC橋	2021	1969					○					○				
T024	砥石谷橋	市道砥石谷線	4.5	3.6	RC橋	2021	1966					○					○				
T025	清水原橋	市道清水原1号線	4.1	12.8	RC橋	2020	1969			○						○					
T026	春畑橋	市道測ノ尾線	2.4	5.4	RC橋	2022	不明						○					○			
T027	塔ノ原橋	市道測ノ尾線	14.3	3.2	PC橋	2024	1967							○						○	
T028	西谷橋	市道石転線	4.2	4.5	RC橋	2021	2010					○					○				
T029	永松橋	市道永松枯木ノ塔線	15.8	6.2	PC橋	2021	2000					○					○				
T030	竹下第2橋	市道竹下三船線	4.0	7.0	RC橋	2020	1932			○						○					
T031	三船橋	市道竹下三船線	28.3	6.3	PC橋	2020	1973			○						○					
T032	竹下第1橋	市道本町本堂線	3.4	6.7	RC橋	2021	1998					○					○				
T033	稗ノ浦橋	市道稗ノ浦線	4.1	3.4	PC橋	2021	1955					○					○				
T034	下砥石川橋	市道宿下砥石川線	3.7	2.8	RC橋	2021	1973					○					○				
T035	宿浦橋	市道宿線	4.4	4.8	RC橋	2021	1998					○					○				
T036	砥石川橋	市道永松上砥石川線	5.0	5.6	RC橋	2021	1994					○					○				
T037	上砥石川橋	市道上砥石川線	4.1	2.0	PC橋	2021	1998					○					○				
T038	北ノ浦橋	市道北ノ浦線	2.4	4.6	RC橋	2021	2021					○					○				
T041	昭和橋	市道市役所線	8.4	8.0	鋼橋	2021	1965					○					○				
T042	円応寺橋	市道円応寺線	5.6	4.3	RC橋	2021	1987					○					○				
T043	明暗谷橋	市道中島線	5.3	4.8	RC橋	2021	1990					○					○				
T044	山口橋	市道山口中島線	9.0	5.7	PC橋	2020	1971			○						○					
T045	寺路橋	市道館甘久線	5.2	5.5	RC橋	2021	1966					○					○				
T046	川向橋	市道庄屋畑中線	4.3	3.7	RC橋	2021	1982					○					○				
T047	昭和1号橋	市道一ノ坪荻町線	6.2	7.3	RC橋	2021	不明					○					○				
T048	昭和6号橋	市道荻町一ノ坪線	5.1	6.6	RC橋	2021	1971					○					○				
T049	昭和103号橋	市道一ノ坪駅東線	5.2	8.6	RC橋	2021	1971					○					○				
T050	昭和108号橋	市道一ノ坪梶原線	5.3	6.6	RC橋	2021	1971					○					○				
T051	昭和109号橋	市道荻町野田線	5.1	6.6	RC橋	2021	1970					○					○				
T052	明神橋	市道黒尾町五反田線	42.0	12.8	鋼橋	2020	1988			○						○					
T053	小楠橋	市道梶原楠町線	2.6	14.5	RC橋	2021	不明					○					○				
T055	戸樋渡橋	市道小楠花島線	42.0	11.0	PC橋	2018	2018			○						○					
T062	十区橋	市道会町線	3.4	8.4	RC橋	2021	1981					○					○				
T063	上の橋	市道永島花島線	2.9	3.5	RC橋	2020	1934			○						○					
T064	無名橋1	市道片白花島線	2.5	5.5	RC橋	2021	不明					○					○				
T065	和田橋	市道和田一本松線	2.2	8.3	RC橋	2021	1975					○					○				
T067	六田新橋	市道橋中央線	13.0	9.1	PC橋	2020	1972			○						○					
T068	六田陸橋	市道橋中央線	35.4	6.7	RC橋	2020	1982			○						○					
T069	武雄大橋	市道橋中央線	46.6	6.2	PC橋	2020	1973	5,922	ひびわれ注入工、断面修復工等	○		◎	●	●	●						
T070	上力陸橋	市道橋中央線	55.2	6.7	RC橋	2020	1982	464	ひびわれ注入工、断面修復工等	○						○	◎	●			
T071	上力新橋	市道橋中央線	13.0	6.7	PC橋	2020	1975			○						○					
T072	迎田橋	市道西浦天神崎線	44.6	16.8	PC橋	2020	1987	5,609	ひびわれ注入工、断面修復工等	○						○	◎	●	●	●	
T073	花島橋	市道鳴瀬花島線	17.1	10.0	PC橋	2020	1986			○						○					
T074	上西山橋	市道若葉台線	14.3	8.5	PC橋	2022	2013					○						○			
T075	上野橋	市道溝ノ上中央線	29.0	5.0	PC橋	2020	1987			○						○					
T076	無名橋2	市道溝ノ上中央線	2.3	4.4	RC橋	2021	不明					○					○				
T077	無名橋3	市道武雄甘久線	2.6	16.4	RC橋	2021	不明					○					○				
T078	無名橋4	市道武雄甘久線	4.6	19.8	RC橋	2021	不明					○					○				
T101	北上野橋	市道上野永野線	4.6	4.7	RC橋	2021	1968					○					○				
T102	玉江橋	市道上野永野線	5.2	5.8	RC橋	2023	1968							○					○		

○：点検 ◎：設計 ●：工事

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	構造 形式	最新 点検 年次	架設 年度	補修費 (万円)	主な対策内容	対策の内容・時期										
										2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	
T103	草場橋	市道城口櫛崎線	14.5	6.3	PC橋	2020	1974			○					○					
T104	郷ノ木橋	市道城口郷ノ木線	5.2	10.0	RC橋	2021	1985				○					○				
T109	搦ノ木橋	市道鳴瀬花鳥線	4.9	10.0	RC橋	2021	1981				○					○				
T113	柚ノ木原第1橋	市道南北櫛崎線	7.5	4.8	RC橋	2021	1975				○					○				
T114	立石橋	市道草場線	5.1	6.4	PC橋	2021	不明				○					○				
T115	北櫛崎橋	市道草場線	4.7	5.8	RC橋	2021	1975				○					○				
T116	仲橋	市道片白花鳥線	60.1	6.0	PC橋	2020	1973	7,000	横締め補修、ひびわれ注入工、断面修復工等	○	◎	●	●	●	○					
T117	大納橋	市道片白花鳥線	5.1	5.2	RC橋	2021	不明				○					○				
T120	鐘撞第1橋	市道釈迦寺線	4.3	5.6	RC橋	2021	1967				○					○				
T121	鐘撞第2橋	市道釈迦寺線	2.7	5.3	RC橋	2021	1967				○					○				
T122	沖永橋	市道橋中央線	6.3	6.8	PC橋	2020	1976			○					○					
T123	大日橋	市道橋中央線	13.8	6.8	PC橋	2020	1976			○					○					
T124	印輪橋	市道橋中央線	52.9	6.5	PC橋	2023	1974			○				○				○		
T125	天神新橋	市道橋中央線	12.6	7.1	PC橋	2020	1977			○					○					
T128	梅ノ木原第1橋	市道土場線	14.4	4.9	PC橋	2020	1975			○					○					
T131	小野原橋	市道郷ノ木小野原線	14.2	3.8	PC橋	2020	1973			○					○					
T132	北古賀橋	市道小野原線	16.2	5.2	PC橋	2020	1988			○					○					
T135	河副橋	市道川副線	15.0	4.8	PC橋	2020	1977			○					○					
T136	釈迦寺橋	市道釈迦寺大日線	60.3	4.3	PC橋	2023	1972						○					○		
T137	志田町橋	市道釈迦寺大日線	4.6	5.6	RC橋	2021	1983				○					○				
T138	水町橋	市道釈迦寺大日線	3.0	5.5	RC橋	2021	1973				○					○				
T139	一本松橋	市道鳴瀬沖永線	4.6	4.5	RC橋	2021	1980				○					○				
T140	二俣第1橋	市道二俣沖永線	3.6	4.3	RC橋	2021	1935				○					○				
T141	二俣第2橋	市道二俣沖永線	4.5	4.5	RC橋	2021	1980				○					○				
T142	六田橋	市道高橋沖永線	3.4	4.5	RC橋	2021	1973				○					○				
T143	樋道橋	市道高橋沖永線	49.0	3.7	PC橋	2020	1993			○					○					
T144	上力橋	市道高橋沖永線	11.0	4.8	RC橋	2021	1987				○					○				
T145	二俣東橋	市道二俣線	21.8	5.7	PC橋	2020	1984			○					○					
T146	沖永大橋	市道橋中央線	21.3	7.2	PC橋	2020	1988			○					○					
T148	鐘撞橋	市道鐘撞谷線	7.5	6.8	RC橋	2023	1985	526	ひびわれ注入工、断面修復工等		◎	●	○					○		
T149	片白橋	市道鐘撞谷線	49.3	4.9	PC橋	2020	1989				○					○				
T150	清ノ上橋	市道清ノ上上野線	30.2	6.2	PC橋	2020	1987			○					○					
T151	無名橋5	市道玉江1号線	4.9	6.6	RC橋	2021	不明				○					○				
T152	上野西橋	市道上中小路線	3.3	4.6	RC橋	2021	1991				○					○				
T153	中牟田橋	市道片白花鳥線	17.0	6.0	PC橋	2020	1990			○					○					
T154	無名橋6	市道橋中央線	8.4	6.8	PC橋	2023	1975						○					○		
T155	無名橋7	市道永島納手線	5.8	4.6	RC橋	2023	1990						○					○		
T156	牛飼橋	市道櫛崎線	15.0	7.8	PC橋	2020	1980			○					○					
T157	天神橋	市道櫛崎線	12.7	8.2	PC橋	2020	1990			○					○					
T158	黒丸橋	市道高橋沖永線	19.5	4.8	PC橋	2020	1992			○					○					
T202	藤田橋	市道高橋中野線	2.4	4.5	RC橋	2021	1963				○					○				
T203	一の川橋	市道杉岳中山線	5.0	7.2	RC橋	2021	1969				○					○				
T204	二の川橋	市道杉岳中山線	17.4	6.2	PC橋	2023	1981						○					○		
T205	三の川橋	市道杉岳中山線	11.1	6.2	PC橋	2020	1982			○					○					
T206	間魔王橋	市道武雄高橋線	2.3	14.5	RC橋	2021	不明				○					○				
T207	中副橋	市道武雄高橋線	10.1	13.1	PC橋	2020	1979			○					○					
T208	ズウメキ橋	市道武雄高橋線	2.5	11.8	RC橋	2021	不明				○					○				
T209	享保橋	市道武雄高橋線	24.7	10.0	PC橋	2020	1989			○					○					
T211	繁昌橋	市道黒尾繁昌線	8.3	8.1	PC橋	2023	1976						○					○		
T212	笹川橋	市道高橋沖永線	20.1	7.2	PC橋	2020	1984			○					○					
T213	甘久崎橋	市道高橋甘久橋	11.3	4.8	PC橋	2022	1978					○					○			
T214	丁の坪橋	市道高橋甘久橋	2.3	4.4	RC橋	2021	1978				○					○				
T215	出店橋	市道間魔王線	5.9	7.1	RC橋	2021	1989				○					○				
T216	石木橋	市道石木線	5.1	8.1	RC橋	2021	不明				○					○				
T217	新堀橋	市道新堀線	13.0	7.2	PC橋	2024	1940							○					○	
T218	船瀬橋	市道高橋裏町線	5.6	4.4	PC橋	2023	1999						○					○		
T219	妙輪寺橋	市道高橋線	6.2	8.6	RC橋	2023	1987						○					○		
T220	大鹿第1橋	市道高橋線	2.1	10.5	RC橋	2021	1935				○					○				
T222	大鹿第2橋	市道大鹿北上滝線	2.8	7.2	RC橋	2021	1983				○					○				
T223	岩井橋	市道藤田線	9.0	5.0	PC橋	2020	1979			○					○					
T224-1	笹尾橋	市道藤田笹ノ尾線	3.4	6.4	RC橋	2021	1979				○					○				
T224-2	笹尾橋側道橋	市道藤田笹ノ尾線	5.0	3.0	PC橋	2023	1979						○					○		
T225	十郎橋	市道牛ノ谷線	6.6	3.0	RC橋	2023	1943						○					○		

○：点検 ◎：設計 ●：工事

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	構造 形式	最新 点検 年次	架設 年度	補修費 (万円)	主な対策内容	対策の内容・時期										
										2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	
T226	牛ノ谷橋	市道黒尾中野橋	3.5	5.1	RC橋	2021	不明				○					○				
T227	黒尾橋	市道黒尾線	14.7	7.2	PC橋	2020	1992			○					○					
T228	沼口橋	市道沼口線	6.7	12.7	RC橋	2021	1973				○					○				
T229	中小路橋	市道寺東線	7.0	4.6	RC橋	2021	1978				○					○				
T230	伏原橋	市道伏原線	4.0	3.3	RC橋	2021	1965				○					○				
T231	中適第1橋	市道川上中山線	5.9	3.8	RC橋	2023	1956						○					○		
T232	中適第2橋	市道川上中山線	3.8	4.4	RC橋	2021	1961				○					○				
T233	中川橋	市道川上繁昌線	7.4	4.8	PC橋	2021	1976				○					○				
T234	戸坂橋	市道繁昌戸坂線	9.4	6.2	PC橋	2021	1997				○					○				
T235	樋ノ川内橋	市道繁昌戸坂線	3.7	3.7	RC橋	2021	1954				○					○				
T239	茶洗橋	市道高橋中野線	14.0	11.3	PC橋	2020	1986			○					○					
T240	沖田橋	市道高橋上滝線	14.0	5.2	PC橋	2022	1985					○						○		
T241	中橋	市道高橋甘久線	27.5	6.2	PC橋	2020	1988			○					○					
T242	湯谷橋	市道繁昌馬場線	76.3	8.2	鋼橋	2023	2001						○					○		
T243	仙々原橋	市道繁昌馬場線	14.6	10.0	PC橋	2022	1985	552	ひびわれ注入工等		◎	●					○			
T301	御所橋	市道御所川内線	9.9	5.1	鋼橋	2020	1970	1,642	塗装塗替工、ひびわれ注入工、断面修復工等	○					○			◎	●	
T302	永野第1橋	市道御所川内線	15.5	5.1	鋼橋	2020	1968			○					○					
T303	永野第2橋	市道御所川内線	5.6	5.2	RC橋	2022	1968					○					○			
T304	中島橋	市道御所川内線	8.0	5.1	PC橋	2022	1966					○					○			
T305	梅の木橋	市道川古武内線	21.1	10.2	PC橋	2020	1974			○					○					
T307	清正寺第2橋	市道清正寺黒牟田線	10.3	4.1	RC橋	2022	1977					○					○			
T308	清正寺第3橋	市道清正寺黒牟田線	4.2	3.9	RC橋	2021	1957				○					○				
T309	菅牟田橋	市道附防菅牟田線	6.2	4.6	RC橋	2021	1964				○					○				
T310	古場山2号橋	市道古場山線	5.2	4.4	RC橋	2021	1964				○					○				
T311	古場山1号橋	市道古場山線	3.5	3.3	RC橋	2021	不明				○					○				
T312	長尾橋	市道寺ノ元山中線	4.9	9.2	RC橋	2021	1989				○					○				
T313	釜石橋	市道山中釜石線	4.8	3.0	RC橋	2021	1962				○					○				
T314	楠川橋	市道附防1号線	13.4	5.2	PC橋	2022	1991					○					○			
T315	鳥井手橋	市道附防血宿線	12.9	4.7	PC橋	2022	1968					○					○			
T316	次郎ヶ谷橋	市道附防血宿線	3.1	4.8	RC橋	2021	1961				○					○				
T317	野中橋	市道夫婦石附防線	7.5	4.4	RC橋	2022	1984					○					○			
T318	大山口橋	市道御所川古山中線	6.5	3.5	RC橋	2023	1963						○					○		
T319	殿内橋	市道御所川古山中線	2.5	3.5	RC橋	2021	1960				○					○				
T320	福渡橋	市道下組線	13.2	3.8	PC橋	2022	1969					○					○			
T321	水無橋	市道下組線	5.7	3.4	RC橋	2023	1968	73	断面修復工等				○					○ ◎	●	
T322	松ヶ平橋	市道下組線	3.5	4.5	RC橋	2021	不明				○					○				
T323	血宿第1橋	市道血宿菅牟田線	5.2	9.3	RC橋	2022	1975					○					○			
T324	次郎ヶ谷新橋	市道血宿菅牟田橋	6.0	7.2	RC橋	2021	不明				○					○				
T325	血宿第2橋	市道橋口線	3.3	3.7	RC橋	2021	1955				○					○				
T326	血宿第3橋	市道小路線	2.4	6.5	RC橋	2021	1975				○					○				
T327	井手川橋	市道上宿血宿線	19.3	5.2	PC橋	2020	1989			○					○					
T328	大楠橋	市道上宿血宿線	3.7	5.0	RC橋	2021	1955				○					○				
T329	大石谷橋	市道大石谷線	4.3	6.3	RC橋	2021	1984				○					○				
T331	下村橋	市道下村線	2.0	5.1	RC橋	2021	1984				○					○				
T332	川久保橋	市道川久保線	3.9	6.7	RC橋	2021	1969				○					○				
T334	測の上第2橋	市道測ノ上線	23.9	4.2	PC橋	2020	1986			○					○					
T335	荒川橋	市道荒川1号線	11.9	6.2	PC橋	2020	2012			○					○					
T336	栞橋	市道川古原線	7.7	5.0	PC橋	2023	1974	188	断面修復工等				○					○ ◎	●	
T337	大深橋	市道下村黒岩線	3.9	4.6	RC橋	2021	1973				○					○				
T338	黒岩橋	市道下村黒岩橋	4.0	6.0	RC橋	2021	不明				○					○				
T339	大平橋	市道大平線	7.5	3.4	RC橋	2023	1964	473	断面修復工等				○					○ ◎	●	
T340	毘沙門橋	市道本部線	30.2	5.0	鋼橋	2020	1974			○					○					
T341	宿橋	市道本部萩ノ尾線	3.7	3.2	RC橋	2020	1972			○					○					
T342	五反田橋	市道寺ノ元宿線	29.0	4.8	鋼橋	2020	1972			○					○					
T343	早川橋	市道早川線	63.8	5.2	PC橋	2023	2006						○					○		
T344	夫婦石橋	市道附防菅牟田線	7.7	6.2	RC橋	2023	1988						○					○		
T345	神山橋	市道本部ダム線	11.8	5.0	PC橋	2022	1986					○					○			
T346	川古大橋	市道若木工業団地1号線	20.6	12.8	PC橋	2020	1989			○					○					
T347	川内橋	市道川内線	8.6	6.4	PC橋	2023	1978						○					○		
T348	小路橋	市道川内線	4.0	4.4	RC橋	2021	不明				○					○				
T349	川内大橋	市道川内線	37.5	6.2	PC橋	2020	1984			○					○					
T350	大楠第2橋	市道大楠公園線	5.3	5.6	RC橋	2023	1994						○					○		
T401	真西橋	市道川古武内線	61.9	10.3	PC橋	2021	2007				○					○				

○：点検 ◎：設計 ●：工事

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	構造 形式	最新 点検 年次	架設 年度	補修費 (万円)	主な対策内容	対策の内容・時期									
										2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)
T402	恩明寺橋	市道多々良線	2.2	11.2	RC橋	2021	不明				○					○			
T403	中山橋	市道多々良袖ノ木原線	12.5	4.6	PC橋	2022	1970					○					○		
T404	桜川橋	市道多々良袖ノ木原線	4.0	5.2	RC橋	2021	1970				○					○			
T405	平古場橋	市道黒牟田線	5.4	8.0	PC橋	2023	1998						○					○	
T406	黒牟田橋	市道黒牟田線	4.1	4.4	RC橋	2021	1970				○					○			
T407	筏橋	市道西ノ角線	30.0	5.8	PC橋	2020	1975			○					○				
T408	前田橋	市道森ノ木伊藤山線	13.0	10.8	PC橋	2020	1997			○					○				
T409	森ノ木橋	市道森ノ木伊藤山線	23.0	10.8	PC橋	2020	1997			○					○				
T410	袖ノ木原橋	市道今古場1号線	6.3	4.8	PC橋	2023	1996						○					○	
T411	西之角橋	市道馬渡線	8.7	4.7	RC橋	2020	1933			○					○				
T412	内田橋	市道内田線	9.4	5.2	RC橋	2023	1998						○					○	
T413	長谷橋	市道長谷館線	18.0	10.0	PC橋	2020	1980			○					○				
T414	唐千田橋	市道長谷福和線	11.2	4.8	鋼橋	2020	1988			○					○				
T415	鶴ノ原橋	市道鶴ノ原線	5.9	4.5	RC橋	2021	1976				○					○			
T416	藤ノ元第2橋	市道古場中線	4.0	5.2	RC橋	2021	1971				○					○			
T417	古場中橋	市道多々良東線	13.5	4.6	PC橋	2021	1971				○					○			
T418	藤ノ元第1橋	市道平柿藤ノ元線	13.5	4.8	PC橋	2021	1971				○					○			
T419	岩名橋	市道多々良小峠線	14.5	5.2	PC橋	2020	2001			○					○				
T420	小峠橋	市道多々良小峠線	12.5	4.6	PC橋	2022	1970	2,022	ひびわれ注入工, 断面修復工等			○					○	◎	●
T421	小谷橋	市道今古場2号線	3.7	4.5	RC橋	2021	1964				○					○			
T422	岩の元橋	市道東袖ノ木原線	8.6	5.3	RC橋	2023	1968						○					○	
T423	丸山橋	市道丸山線	21.1	5.2	PC橋	2020	1982			○					○				
T424	鳥越橋	市道鳥越松尾線	20.1	6.2	PC橋	2020	1978			○					○				
T425	松尾橋	市道鳥越松尾線	7.9	6.0	PC橋	2023	1978						○					○	
T426	中道橋	市道平古場中道線	5.5	4.5	RC橋	2023	1978						○					○	
T427	中央橋	市道平古場中央線	6.6	4.6	RC橋	2023	1998						○					○	
T429	畠野橋	市道畠野前道線	18.8	2.2	RC橋	2020	不明			○					○				
T430	宮之瀬橋	市道鳥越海正原線	24.2	5.8	PC橋	2020	1978			○					○				
T432	藤原橋	市道下黒木前田線	4.3	4.4	PC橋	2021	1975				○					○			
T433	梅野橋	市道梅野線	30.0	4.8	PC橋	2020	1973			○					○				
T434	桑原橋	市道桑原線	7.3	4.0	RC橋	2023	1982						○					○	
T436	柳原橋	市道上古賀福和線	12.6	6.0	PC橋	2022	1973				○						○		
T437	福和橋	市道上古賀福和線	3.9	5.0	RC橋	2021	1971				○					○			
T438	船石橋	市道船石線	9.6	4.2	RC橋	2023	1971						○					○	
T439	本谷橋	市道本谷線	5.8	4.6	RC橋	2023	1995						○					○	
T440	隠城橋	市道隠城線	3.5	3.8	RC橋	2021	1971				○					○			
T441	上古賀橋	市道上古賀鳥越線	27.1	6.0	PC橋	2020	1979			○					○				
T442	福和第2橋	市道長谷福和線	3.8	7.6	RC橋	2021	1988				○					○			
T443	宮平橋	市道宮平線	4.9	4.5	RC橋	2020	1964			○					○				
T501	中修寺橋	市道淵ノ尾内田線	6.9	11.4	RC橋	2020	1989			○					○				
T502	山副橋	市道淵ノ尾内田線	11.2	11.3	PC橋	2020	1993			○					○				
T505	谷ノ浦第1橋	市道上野永野線	3.3	6.6	RC橋	2021	1937				○					○			
T507	駄渡瀬橋	市道大野原南永野線	20.8	6.2	PC橋	2020	1984			○					○				
T508	郷ノ原第1橋	市道大野原南永野線	5.3	5.8	RC橋	2023	1975						○					○	
T509	郷ノ原第3橋	市道焼山郷ノ原線	5.6	6.5	RC橋	2023	1975						○					○	
T510	郷ノ原第2橋	市道焼山郷ノ原線	3.0	11.6	RC橋	2021	1975				○					○			
T511	榎川橋	市道亀屋大野原線	20.0	5.8	PC橋	2020	1972			○					○				
T512	思ノ木橋	市道亀屋大野原線	4.7	6.5	RC橋	2023	1972						○					○	
T513	大谷第1橋	市道大谷橋	2.2	6.4	RC橋	2021	1989				○					○			
T517	原田橋	市道岡方大山路線	5.5	5.8	RC橋	2023	1952						○					○	
T518	楠峯橋	市道岡方大山路線	5.8	4.4	RC橋	2023	1964	497	断面修復工等				○		◎	●		○	
T519	牛鬼谷橋	市道峯橋峯線	3.8	9.2	RC橋	2021	1974				○					○			
T520	高早橋	市道百木線	12.6	4.6	PC橋	2022	1969	870	断面修復工等			○◎	●				○		
T521	百木第1橋	市道百木線	6.2	4.9	RC橋	2023	1962	995	断面修復工等			◎	●					○	
T522	百木第2橋	市道百木線	3.6	4.5	RC橋	2021	1962				○					○			
T523	百木第3橋	市道百木線	4.6	4.6	RC橋	2021	1966				○					○			
T524	宮之橋	市道天竜庵弓野線	15.7	5.8	PC橋	2020	1973			○					○				
T525	川登橋	市道天竜庵弓野線	15.4	5.8	鋼橋	2020	1969			○					○				
T526	宇土手橋	市道周路線	17.7	10.5	PC橋	2020	1994			○					○				
T527	谷ノ浦第2橋	市道谷ノ浦橋	2.3	15.1	RC橋	2021	1986				○					○			
T529	於五殿橋	市道谷ノ浦焼山線	4.2	4.2	RC橋	2021	1960				○					○			
T530	焼山橋	市道谷ノ浦七田線	8.5	3.6	RC橋	2023	1968	106	ひびわれ注入工等				○					○◎	●
T534	末広橋	市道西光寺大山路線	10.6	4.8	PC橋	2022	1993					○					○		

○：点検 ◎：設計 ●：工事

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	構造 形式	最新 点検 年次	架設 年度	補修費 (万円)	主な対策内容	対策の内容・時期										
										2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	
T536	中田橋	市道餅割線	5.1	8.4	RC橋	2022	2000						○				○			
T537	老松橋	市道老松線	5.2	4.4	RC橋	2023	1976						○					○		
T538	北川第1橋	市道北川線	5.4	6.4	RC橋	2023	1976	1,921	断面修復工等	◎	●	●	●					○		
T539	無名橋8	市道北川線	8.5	6.0	RC橋	2023	1976						○					○		
T540	峯橋	市道峯亀屋橋	2.3	6.1	RC橋	2021	1982					○				○				
T545	山揚橋	市道山揚線	2.8	3.8	RC橋	2021	1966					○				○				
T546	天竜庵橋	市道天竜庵中央線	3.4	4.4	RC橋	2023	2017						○					○		
T547	平尻橋	市道天竜庵線	4.3	5.1	RC橋	2021	1982					○				○				
T549	郷ノ原大橋	市道郷ノ原線	21.0	9.3	PC橋	2020	1986			○					○					
T550	萩原橋	市道大野原萩原線	43.3	6.7	PC橋	2020	1989					○				○				
T551	姥子ノ原橋	市道宇土手線	37.3	5.0	PC橋	2020	1989					○				○				
T552	前山橋	市道周路東線	39.0	6.0	PC橋	2020	1989					○				○				
T553	貴船橋	市道貴船線	16.9	5.0	PC橋	2020	1987			○					○					
T554	志志香橋	市道二又線	5.1	4.8	RC橋	2023	1988						○					○		
T555	拓田橋	市道上野永野線	11.4	8.2	PC橋	2020	1990			○					○					
T556	馬正之元橋	市道北永野三又線	9.8	5.0	PC橋	2023	1992						○					○		
T557	無名橋9	市道西光寺北永野橋	2.1	6.0	RC橋	2021	不明					○				○				
T558	南田橋	市道北永野三又線	12.8	6.0	PC橋	2022	1989						○				○			
T559	島の坪橋	市道千手寺西光寺線	11.7	5.0	PC橋	2022	1991						○				○			
T560	無名橋10	市道郷ノ原五反田橋	3.0	12.5	RC橋	2021	不明					○				○				
T561	無名橋11	市道天竜庵上館線	5.0	3.5	PC橋	2023	1973						○					○		
T601	長谷橋	市道小田志線	2.7	4.0	RC橋	2021	不明					○				○				
T602	小田志橋	市道小田志線	5.7	5.8	RC橋	2023	1991						○					○		
T603	神乃園橋	市道庭木線	14.0	7.7	RC橋	2023	1934						○					○		
T604	庭木第一橋	市道庭木線	18.7	10.3	PC橋	2023	2001	281	ひびわれ注入工等				○			◎	●	○		
T610	矢筈第4橋	市道矢筈線	9.4	9.7	PC橋	2023	1993						○					○		
T611	矢筈第5橋	市道矢筈線	4.6	22.6	RC橋	2021	1994					○				○				
T613	椎ノ木橋	市道平九郎線	8.6	6.0	PC橋	2023	1978						○					○		
T614	早ノ谷橋	市道早ノ谷線	2.3	4.4	RC橋	2021	1969					○				○				
T615	中畑橋	市道亀屋田尻線	8.7	13.3	RC橋	2023	1988						○					○		
T617	岩迄第2橋	市道埴ノ浦線	7.5	3.8	RC橋	2023	1969						○					○		
T618	屋敷田橋	市道屋敷田線	4.1	3.4	RC橋	2021	1965					○				○				
T620	白木原橋	市道赤木白木原線	3.6	4.5	RC橋	2021	1974					○				○				
T621	寺屋敷橋	市道寺屋敷線	4.5	7.2	RC橋	2022	1987						○				○			
T622	円城原橋	市道平古場線	9.4	8.3	RC橋	2023	1996						○					○		
T623	平古場橋	市道平古場線	13.6	8.0	PC橋	2022	1996						○				○			
T624	井堀第1橋	市道井堀上園線	2.3	5.6	RC橋	2022	1965						○				○			
T626	高瀬橋	市道下庭木線	12.3	10.5	RC橋	2020	1991			○					○					
T627	下庭木橋	市道下庭木線	5.7	10.0	RC橋	2023	1991						○					○		
T628	大坂橋	市道東線	5.4	3.9	RC橋	2023	1952						○					○		
T629	小川内第1橋	市道小川内線	4.9	4.4	RC橋	2022	1966						○				○			
T634	藤兵工谷第1橋	市道藤兵工谷線	4.9	3.5	RC橋	2022	1976						○				○			
T635	藤兵工谷第2橋	市道藤兵工谷線	4.6	3.0	RC橋	2022	1944						○				○			
T636	持山橋	市道持山線	10.6	6.1	石橋	2022	1933						○				○			
T637	川良田第1橋	市道釜田持山線	6.8	4.5	RC橋	2023	1991						○					○		
T638	川良田第2橋	市道釜田持山線	4.6	13.7	石橋	2023	1944						○					○		
T639	川良田第3橋	市道釜田持山線	10.3	4.8	PC橋	2022	1998						○				○			
T640	母辺田第1橋	市道母辺田線	7.9	5.1	PC橋	2023	1974						○					○		
T642	宮前橋	市道下鶴1号線	8.8	5.2	PC橋	2023	1975						○					○		
T643	鶴芝橋	市道下鶴2号線	11.2	5.0	RC橋	2022	1989						○				○			
T644	柳谷橋	市道江良井手川内線	11.4	6.2	RC橋	2022	1987						○				○			
T646	犬吠橋	市道庭木神六線	9.5	3.6	鋼橋	2023	1968						○					○		
T647	柿田橋	市道庭木神六線	9.4	3.6	PC橋	2023	1971						○					○		
T648	神六橋	市道番所線	8.3	4.7	鋼橋	2023	1969						○					○		
T649	番所第2橋	市道番所線	3.5	5.2	RC橋	2022	不明						○				○			
T650	横道第1橋	市道村内1号線	4.6	4.8	RC橋	2022	1973						○				○			
T651	岳第1橋	市道村内2号線	6.5	4.7	RC橋	2023	1973						○					○		
T652	長蓮和橋	市道長蓮和線	3.3	6.0	RC橋	2022	1973						○				○			
T653	川良田橋	市道川良田線	3.0	3.3	RC橋	2022	1970						○				○			
T654	横道第3橋	市道岳線	5.0	5.6	RC橋	2023	1968							○				○		
T655	辰石橋	市道辰石1号線	6.9	5.0	RC橋	2023	1992						○					○		
T656	笹ノ元橋	市道辰石1号線	3.8	3.1	石橋	2022	1946						○				○			
T657	矢筈第一橋	市道矢筈線	37.5	10.0	PC橋	2020	1988			○					○					

○：点検 ◎：設計 ●：工事

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	構造 形式	最新 点検 年次	架設 年度	補修費 (万円)	主な対策内容	対策の内容・時期										
										2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	
T658	江良橋	市道一町田高瀬線	11.5	5.2	RC橋	2022	1987													
T659	小田志第2橋	市道長谷小田志線	12.5	10.0	PC橋	2020	2010			○					○					
T660	屋敷田橋	市道小田志端野線	8.7	9.2	RC橋	2020	1982			○					○					
T661	扇野橋	市道小田志端野線	4.5	10.2	RC橋	2022	1975					○						○		
T662	大川内第一橋	市道小田志端野線	5.3	8.0	RC橋	2022	1975	1,486	断面修復工等			○						○	◎	●
T663	井手川内橋	市道江良井手川内線	3.0	7.9	PC橋	2022	1988					○						○		
T664	第2神六橋	市道野田線	11.8	8.3	RC橋	2022	1972	2,521	ひびわれ注入工等			○						○	◎	●
T674	島坪橋	市道田測線	12.4	5.2	PC橋	2022	1991					○						○		
T675	無名橋14	市道和田一本松線	2.9	9.0	RC橋	2023	不明						○						○	
T676-1	小路橋	市道鳴瀬1号線	4.9	6.9	RC橋	2023	1973						○						○	
T676-2	小路橋側道橋	市道鳴瀬1号線	6.5	3.0	PC橋	2023	不明						○						○	
T677	無名橋15	市道椎木谷線	4.0	4.8	RC橋	2022	1987					○						○		
T679	池ノ谷橋	市道櫛崎東線	2.9	7.0	RC橋	2022	不明					○						○		
T680	小僧山橋	市道櫛崎東線	3.4	6.4	RC橋	2021	不明					○				○				
T681	永野橋	市道寺ノ下南永野線	24.1	4.9	鋼橋	2023	1970							○					○	
T682	庭木第2橋	市道押ヶ測線	8.1	4.4	PC橋	2023	1971						○						○	
T683	明音谷第二橋	市道五ノ角明暗谷線	19.5	11.0	PC橋	2021	2001				○					○				
T684	小路橋	市道西田小路線	5.3	6.2	PC橋	2023	2002						○						○	
T685	無名橋16	市道一ノ坪1号線	4.5	7.2	RC橋	2023	不明						○						○	
T687	無名橋17	市道杉岳中山線	2.8	4.4	RC橋	2022	不明					○						○		
T690	無名橋18	市道インター西線	5.3	5.6	RC橋	2023	1990	439	ひびわれ注入工等		◎	●	○						○	
T693	無名橋19	市道インター東線	6.9	4.6	RC橋	2023	1990	1,140	ひびわれ注入工等		◎	●	○						○	
T694	岡方1号橋	市道岡方大山路線	3.3	5.6	RC橋	2022	不明					○						○		
T695	無名橋21	市道インター東線	5.9	10.3	RC橋	2022	1982					○						○		
T696	武雄川橋	市道武雄甘久線	26.5	16.9	鋼橋	2021	1966	13,312	塗装塗替え工, 断面修復工、支承防錆工等		○	◎	●	●	●	●				
T697	富岡橋	市道武雄甘久線	9.4	16.6	PC橋	2023	1966	1,164	ひびわれ注入工, 断面修復工等				○						○ ◎	●
T698	新甘久橋	市道武雄甘久線	12.3	12.2	PC橋	2020	1966			○					○					
T700	無名橋23	市道高架側道1号線	3.2	29.8	RC橋	2023	不明						○						○	
T701	日吉第一橋	市道高架側道4号線	10.9	7.2	PC橋	2022	2010					○						○		
T702	日吉第二橋	市道高架側道5号線	10.9	7.2	PC橋	2022	2002					○						○		
T705	井手川橋	市道川古桃川線	25.1	9.8	PC橋	2022	1966					○						○		
T706	測ノ上橋	市道川古桃川線	4.3	7.8	RC橋	2021	不明	33	断面修復工等	◎	●						○			
T706-1	測ノ上橋(拡幅部)	市道川古桃川線	3.9	1.9	RC橋	2021	不明				○						○			
T707	志雄里橋	市道川古桃川線	7.8	9.8	RC橋	2021	不明				○						○			
T708	百堂橋	百堂原線	4.2	8.1	RC橋	2023	不明						○						○	
T709	毘沙門橋	川古桃川線	37.1	8.7	鋼橋	2023	1972						○						○	
T710	柿ノ木瀬橋	川古桃川線	42.0	9.3	PC橋	2023	1980						○						○	
T711	大野山橋	市道東西川登線	38.1	4.9	PC橋	2020	1989				○					○				
T712	武雄競輪場入口歩道橋	市道四十九重線	25.0	1.5	鋼橋	2023	1993		塗装塗替え工, 当て板補強, 舗装打換工等				●		○					
Y001	踊瀬橋	市道踊瀬線	2.5	10.4	RC橋	2021	1970	886	断面修復工等		○					○ ◎	●			
Y002	宿田橋	市道烏海～永尾線	23.8	5.9	PC橋	2022	1976	1,841	ひびわれ注入工, 断面修復工等	◎	●							○		
Y003	重川内橋	市道今山線	7.1	7.2	PC橋	2022	1978					○						○		
Y004	早稲田橋	市道今山線	5.2	5.6	RC橋	2021	1974				○					○				
Y005	野副橋	市道大野～下黒髪線	23.3	10.3	PC橋	2023	2014						○						○	
Y006	合床橋	市道大野～下黒髪線	2.4	14.0	RC橋	2023	1990						○						○	
Y007	萩原橋	市道大野～下黒髪線	2.3	12.1	RC橋	2023	1990						○						○	
Y008	参宮橋	市道黒髪山線	6.4	4.0	RC橋	2022	1976					○						○		
Y009	二の橋	市道黒髪山線	5.7	4.3	RC橋	2022	1976					○						○		
Y010	上宮橋	市道黒髪山線	5.2	5.9	RC橋	2022	1976					○						○		
Y011	堀ノ内橋	市道立野川内線	15.6	12.3	PC橋	2021	2004				○					○				
Y012	川良野橋	市道立野川内線	13.6	6.0	PC橋	2023	1978						○						○	
Y013	測ノ上橋	市道立野川内線	4.0	11.3	RC橋	2022	不明					○						○		
Y014	川内橋	市道山口～谷川内線	7.8	4.0	鋼橋	2022	1976	544	塗装塗替え工, 断面修復工、支承防錆工等		●	○						○		
Y015	下ノ原橋	市道永尾下線	14.2	5.0	PC橋	2023	1984						○						○	
Y016	駄地橋	市道南中～南下線	12.9	6.2	PC橋	2021	1992				○						○			
Y018	根是橋	市道茅場～山浦線	16.4	5.2	PC橋	2021	1978				○						○			
Y019	六地藏橋	市道山浦～中辰線	5.2	4.4	RC橋	2022	1977					○						○		
Y020	小川内橋	市道古門～下山線	4.8	4.1	RC橋	2023	1977						○						○	
Y021	蜂ノ巣橋	市道蜂ノ巣～徳蔵線	9.1	6.2	PC橋	2021	2007				○						○			
Y022	永ノ尾橋	市道平野線	6.5	5.1	RC橋	2022	1977					○						○		
Y023	山口橋	市道川内～山口線	8.9	5.1	鋼橋	2022	1976					○						○		
Y024	五反田橋	市道五反田～川内線	8.8	3.0	RC橋	2022	1976					○						○		
Y025	岡方2号橋	市道五反田～岡方線	3.0	4.5	RC橋	2023	1976						○						○	

○：点検 ◎：設計 ●：工事

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	構造 形式	最新 点検 年次	架設 年度	補修費 (万円)	主な対策内容	対策の内容・時期									
										2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)
Y026	山崎橋	市道山崎～平野線	8.8	5.6	PC橋	2022	1976					○					○		
Y027	森橋	市道古郷線	4.8	2.4	RC橋	2022	1976					○					○		
Y028	山崎2号橋	市道山崎～平野線	12.0	2.8	RC橋	2023	1976						○					○	
Y029	中田橋	市道六反田～中田線	9.7	3.5	RC橋	2022	1976					○					○		
Y030	六反田橋	市道六反田～中田線	9.5	1.8	RC橋	2022	1976					○					○		
Y031	松尾橋	市道中山～平野線	9.1	2.3	RC橋	2022	1976					○					○		
Y032	淵副橋	市道谷口～大前田線	12.0	5.0	PC橋	2021	1980				○					○			
Y033	長の坪橋	市道長の坪～上駄地線	13.1	4.5	RC橋	2023	1976						○					○	
Y034	天神橋	市道古子～久郎原線	22.4	6.2	PC橋	2021	2002				○					○			
Y036	上ノ原橋	市道小谷川内～上ノ原線	6.7	3.6	RC橋	2022	1987					○					○		
Y037	垣副橋	市道堀ノ内～垣副線	17.4	4.0	鋼橋	2021	1970				○					○			
Y038	小越橋	市道小越～津々良線	3.9	6.5	RC橋	2023	1970						○					○	
Y039	島海踏道橋	市道古場田～墟ノ谷線	30.1	6.0	RC橋	2023	1980						○					○	
Y040	前田橋	市道野中～前田線	14.8	6.2	PC橋	2021	1981				○					○			
Y041	樋口橋	市道三間坂側道線	9.1	5.1	RC橋	2022	1970					○					○		
Y042	岩ノ口橋	市道三間坂側道線	3.3	3.4	RC橋	2022	1970					○					○		
Y043	牟田橋	市道野中～グミノ木線	2.3	8.7	RC橋	2023	1970						○					○	
Y044	グミノ木橋	市道小ヶ倉～グミノ木線	4.0	6.0	RC橋	2023	1970						○					○	
Y045	宮ノ後橋	市道松ノ元～宮ノ後線	16.3	4.8	PC橋	2021	1977				○					○			
Y046	岩ノ口甲橋	市道岩ノ口1号線	4.0	6.1	RC橋	2023	1980						○					○	
Y047	通り山橋	市道前田～三反田線	9.0	4.8	PC橋	2022	1978					○					○		
Y048	椎ノ木橋	市道山仁田～平原線	6.0	4.4	RC橋	2022	1978					○					○		
Y049	下山橋	市道下山～片ハエ線	6.8	7.6	RC橋	2022	1978					○					○		
Y050	通り山橋	市道通り山～西平線	6.8	4.5	RC橋	2022	1978					○					○		
Y051	三反田橋	市道三反田～前田線	5.8	4.5	RC橋	2021	不明				○					○			
Y052	耕架橋	市道今山～島海線	20.6	7.0	PC橋	2022	1981	2,341	断面修復工等			○			◎	●	●		
Y053	大石橋	市道今山～島海線	4.5	7.2	RC橋	2022	1980					○					○		
Y054	宮ノ前橋	市道宮ノ前1号線	6.5	6.0	RC橋	2022	1978					○					○		
Y055	中川内橋	市道早稲田～坂林線	6.1	5.7	RC橋	2022	1964					○					○		
Y056	坂本橋	市道坂本～土井切線	5.6	11.5	RC橋	2023	1978						○					○	
Y057	黒堂橋	市道黒尾林庵ノ元線	27.7	5.0	PC橋	2021	1983				○					○			
Y058	荷坂橋	市道合床～野副線	3.2	4.1	RC橋	2023	1976						○					○	
Y059	高野谷橋	市道高野谷線	2.5	4.8	RC橋	2023	1970						○					○	
Y060	赤松橋	市道横枕～牛ノ首線	3.0	6.4	RC橋	2023	1980						○					○	
Y061	久保田橋	市道横枕～久保田線	19.4	12.3	PC橋	2021	2003				○					○			
Y062	二ツ枝橋	市道二ツ枝～合床線	4.7	3.5	PC橋	2022	1990					○					○		
Y063	前平橋	市道二ツ枝～合床線	2.4	2.4	RC橋	2023	1980						○					○	
Y064	臼ノ久保橋	市道二ツ枝～臼ノ久保線	4.3	6.5	RC橋	2023	1980						○					○	
Y065	網の内橋	市道網ノ内～今山線	11.4	6.8	PC橋	2021	1974				○					○			
Y066	大砂古橋	市道網ノ内～今山線	8.5	11.9	PC橋	2023	1977						○					○	
Y067	大砂古橋	市道牛ノ首～大砂線	3.7	5.9	RC橋	2023	1977						○					○	
Y068	道祖神橋	市道馬場出～網ノ内線	10.6	5.4	PC橋	2021	1974				○					○			
Y069	簡江2号橋	市道原～古場線	3.5	5.7	RC橋	2022	1986					○					○		
Y070	簡江1号橋	市道原～古場線	3.4	5.8	RC橋	2022	1986					○					○		
Y071	乳待坊橋	市道乳待坊線	11.6	7.2	RC橋	2021	1970				○					○			
Y072	古場4号橋	市道乳待坊線	9.1	7.9	RC橋	2022	1976					○					○		
Y073	古場1号橋	市道古場線	11.7	4.8	RC橋	2021	1968				○					○			
Y074	古場2号橋	市道古場線	8.7	3.4	PC橋	2022	1976					○					○		
Y075	古野橋	市道古場～簡江線	4.2	5.5	RC橋	2023	1976						○					○	
Y076	水尾橋	市道水尾劣住1号線	6.2	6.2	RC橋	2020	不明			○					○				
Y077	弁財橋	市道水尾線	11.7	3.4	RC橋	2021	1975				○					○			
Y078	黒髪岳橋	市道古場2号線	4.6	4.6	RC橋	2021	1976				○					○			
Y079	古場3号橋	市道古場2号線	3.8	4.6	RC橋	2021	1976				○					○			
Y081	上原橋	市道上原～網ノ内線	9.0	4.8	RC橋	2022	1976					○					○		
Y082	麻馬場1号橋	市道麻馬場～蕪山線	6.0	3.6	RC橋	2022	1980					○					○		
Y083	麻馬場2号橋	市道麻馬場～蕪山線	5.4	3.4	RC橋	2022	1980					○					○		
Y084	麻馬場3号橋	市道麻馬場～蕪山線	3.3	3.5	RC橋	2023	1980						○					○	
Y085	大切橋	市道尼面～麻馬場線	5.0	8.5	PC橋	2023	1980						○					○	
Y086	横畑橋	市道横畑～立畑線	9.3	5.8	RC橋	2022	1988				○						○		
Y087	乙宮橋	市道乙宮～宮ノ元線	12.5	4.8	PC橋	2021	1978				○					○			
Y088	蛇神橋	市道宮ノ元～丸田線	13.5	4.0	PC橋	2023	1986						○					○	
Y089	大曲橋	市道大曲～堀ノ内線	17.9	7.5	PC橋	2022	1993					○					○		
Y090	日ノ峯橋	市道狩・日ダム1号線	12.5	5.2	PC橋	2023	1992						○					○	

○：点検 ◎：設計 ●：工事

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	構造 形式	最新 点検 年次	架設 年度	補修費 (万円)	主な対策内容	対策の内容・時期									
										2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)
Y091	中神橋	市道狩・日ダム2号線	9.9	5.9	PC橋	2022	1992					○					○		
Y092	木の登橋	市道狩・日ダム4号線	39.6	5.2	PC橋	2023	1999						○					○	
Y093	柳原橋	市道柳原線	11.6	6.2	PC橋	2021	1991				○					○			
Y094	山ノ上橋	市道柳原線	10.0	5.7	PC橋	2021	1993				○					○			
Y095	原橋	市道原～長者原線	5.5	4.8	RC橋	2022	1986					○					○		
Y096	無名橋20	市道圭郎次～館線	29.7	2.3	RC橋	2023	不明						○					○	
K003	無名橋24	市道白仁田線	6.9	7.5	RC橋	2021	1981	735	ひびわれ注入工等		○	◎	●			○			
K004	無名橋25	市道桜木線	2.6	22.0	RC橋	2022	不明					○					○		
K005	無名橋26	市道桜木線	3.3	6.2	RC橋	2021	不明				○					○			
K006	無名橋27	市道今山線	6.3	5.6	PC橋	2022	1977					○					○		
K007	無名橋28	市道今山線	4.0	16.7	RC橋	2021	不明				○					○			
K008	竹ノ下橋	市道西浦線	8.1	6.2	RC橋	2021	1983				○					○			
K015	無名橋29	市道西杵田地線	7.4	8.5	PC橋	2021	1980				○					○			
K016	無名橋30	市道北方大西線	5.7	6.0	石橋	2021	1976				○					○			
K017	無名橋31	市道澄ヶ岡住宅団地線	7.8	4.3	RC橋	2021	1976				○					○			
K018	無名橋32	市道浦田住宅団地線	7.0	5.0	PC橋	2021	2000				○					○			
K019	浦田橋	市道浦田住宅団地線	10.8	8.1	PC橋	2022	1994					○					○		
K020	丁后橋	市道九羽見線	13.2	8.2	PC橋	2021	1989				○					○			
K021	白岩橋	市道久津具線	16.6	5.5	PC橋	2022	1988					○					○		
K022	無名橋34	市道中道線	2.6	6.3	RC橋	2021	1982				○					○			
K024	船津橋	市道中道線	23.6	7.5	PC橋	2022	1985					○					○		
K025	無名橋35	市道中道線	3.1	7.3	RC橋	2021	不明				○					○			
K026	無名橋36	市道中道線	3.5	4.6	RC橋	2021	1982				○					○			
K027	無名橋37	市道中道線	4.7	4.6	RC橋	2021	1982				○					○			
K028	無名橋38	市道中道線	4.1	4.5	RC橋	2021	1982				○					○			
K029	無名橋39	市道中道線	4.0	4.6	RC橋	2021	1982				○					○			
K030	無名橋40	市道中道線	2.4	4.7	RC橋	2022	1982					○					○		
K031	明ヶ瀬橋	市道船津清池線	22.8	4.0	PC橋	2022	1985					○					○		
K032	無名橋41	市道船津清池線	2.5	4.6	RC橋	2022	1985					○					○		
K033	無名橋42	市道東久津具線	3.5	5.1	RC橋	2021	1977				○					○			
K034	無名橋43	市道北方中央線	4.6	14.9	RC橋	2021	不明				○					○			
K035	無名橋44	市道北方中央線	4.0	15.0	RC橋	2021	不明				○					○			
K036	無名橋45	市道北方中央線	4.6	15.0	RC橋	2021	不明				○					○			
K037	無名橋46	市道北方中央線	3.5	17.4	RC橋	2021	不明				○					○			
K038	無名橋47	市道北方新橋線	5.6	10.6	RC橋	2021	1985				○					○			
K039	無名橋48	市道北方新橋線	3.8	16.6	RC橋	2021	不明				○					○			
K040	無名橋49	市道北方新橋線	4.1	9.2	RC橋	2021	不明				○					○			
K041	無名橋50	市道北方新橋線	4.9	9.3	RC橋	2021	不明				○					○			
K042	無名橋51	市道北方新橋線	2.7	13.9	RC橋	2021	不明				○					○			
K043	無名橋52	市道北方新橋線	7.6	8.3	PC橋	2021	1976				○					○			
K044	無名橋53	市道北方新橋線	4.4	8.8	RC橋	2021	不明				○					○			
K045	広田橋	市道北方新橋線	12.4	8.7	PC橋	2022	1984	61	断面修復工等		●	○					○		
K046	無名橋54	市道志久線	6.3	6.4	RC橋	2021	1976				○					○			
K047	無名橋55	市道下掛橋線	2.8	3.2	石橋	2022	1981					○					○		
K048	無名橋56	市道熊副線	2.2	25.4	RC橋	2022	不明					○					○		
K049	無名橋57	市道熊副線	2.6	8.4	RC橋	2022	不明					○					○		
K050	無名橋58	市道第2牟田浦線	2.3	4.8	RC橋	2022	1977					○					○		
K051	無名橋60	市道牟田浦線	4.1	6.1	RC橋	2021	不明					○				○			
K052	無名橋61	市道牟田浦線	3.2	8.0	RC橋	2022	不明					○					○		
K053	無名橋62	市道高野木ノ元線	2.2	8.6	RC橋	2022	1977					○					○		
K054	無名橋63	市道中峠線	4.1	6.1	RC橋	2021	不明	846	断面修復工等		○				◎	●			
K055	無名橋64	市道鳥川内線	4.8	4.8	RC橋	2021	不明				○					○			
K056	無名橋65	市道鳥川内線	2.5	6.6	RC橋	2022	不明					○					○		
K057	無名橋66	市道掛橋中央線	3.3	3.3	RC橋	2021	1977	751	断面修復工等	●	○					○			
K058	無名橋67	市道弓田線	4.7	5.6	RC橋	2021	1977				○					○			
K059	無名橋68	市道大峠線	2.4	6.0	RC橋	2022	不明	904	ひびわれ注入工、断面修復工等			○				◎	●		
K060	無名橋69	市道大峠線	5.2	7.1	RC橋	2021	1977				○					○			
K061	無名橋70	市道大峠線	2.8	8.3	RC橋	2022	不明					○					○		
K062	無名橋71	市道追分焼米線	2.9	12.0	RC橋	2022	不明					○					○		
K063	無名橋72	市道中谷線	3.5	17.2	RC橋	2022	不明					○					○		
K064	無名橋73	市道中谷線	3.1	8.8	RC橋	2021	不明				○					○			
K065	無名橋74	市道旧国道線	3.7	5.6	RC橋	2021	1977				○					○			
K066	無名橋75	市道旧国道線	2.8	5.0	RC橋	2022	1977					○					○		

○：点検 ◎：設計 ●：工事

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	構造 形式	最新 点検 年次	架設 年度	補修費 (万円)	主な対策内容	対策の内容・時期										
										2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	
K067	無名橋76	市道旧国道線	2.3	4.5	RC橋	2022	1977					○					○			
K068	無名橋77	市道旧国道線	3.1	5.7	PC橋	2021	1977				○						○			
K069	無名橋78	市道旧国道線	4.8	4.5	RC橋	2021	1977	1,777	断面修復工等	●							○			
K070	無名橋79	市道旧国道線	4.7	4.3	RC橋	2021	1977				○						○			
K071	百枚橋	市道馬神原田線	11.0	8.4	RC橋	2022	1985					○					○			
K072	無名橋80	市道追分医王寺線	4.4	11.7	RC橋	2021	不明				○						○			
K073	無名橋81	市道追分医王寺線	3.6	11.2	RC橋	2021	不明				○						○			
K074	掛橋陸橋	市道追分医王寺線	50.0	11.0	PC橋	2021	1981				○						○			
K075	新橋	市道追分医王寺線	102.2	11.0	PC橋	2022	1981	25,000	ひびわれ注入工、断面修復工、伸縮装置取替工、舗装打換工等		●	●	●	●	●	●	○			
K076	芦原陸橋	市道追分医王寺線	50.0	11.0	PC橋	2022	1981	7,000	ひびわれ注入工、断面修復工、伸縮装置取替工、舗装打換工等			●	●	●			○			
K077	無名橋82	市道追分医王寺線	3.5	11.9	RC橋	2021	不明				○						○			
K078	無名橋83	市道西袋線	2.4	7.5	RC橋	2022	不明					○					○			
K079	無名橋84	市道西袋線	8.8	6.2	PC橋	2021	1977				○						○			
K080	無名橋85	市道西袋南北線	2.4	8.0	RC橋	2022	1977					○						○		
K081	無名橋86	市道第2折尾線	8.9	4.8	PC橋	2022	1977					○					○			
K082	無名橋87	市道谷西平線	4.4	4.8	RC橋	2021	不明				○						○			
K083	無名橋88	市道谷西平線	3.7	4.5	RC橋	2021	1982				○						○			
K084	無名橋89	市道谷東線	9.1	3.3	RC橋	2022	1977					○						○		
K085	無名橋90	市道東道線	11.6	14.0	RC橋	2022	不明					○					○			
K086	柘島橋	市道東道線	112.0	8.2	PC橋	2022	1995					○					○			
K087	無名橋91	市道柘島南線	4.8	4.5	RC橋	2021	不明				○						○			
K088	江満堤橋	市道四本松北線	6.0	7.0	PC橋	2021	2003				○						○			
K090	無名橋92	市道堂ノ元線	4.2	11.8	RC橋	2021	不明				○						○			
K091	六本松橋	市道芦原永池線	18.1	6.2	PC橋	2022	2001					○						○		
K092	無名橋93	市道大渡線	3.0	6.6	RC橋	2021	不明				○						○			
K093	三石橋	市道永池線	19.1	7.7	PC橋	2022	2001					○						○		
K094	無名橋94	市道永池線	4.4	5.9	RC橋	2021	1977				○						○			
K095	無名橋95	市道永池線	3.3	5.6	RC橋	2022	不明					○						○		
K096	無名橋96	市道永池線	4.6	6.9	RC橋	2021	不明				○						○			
K097	無名橋97	市道追分医王寺線	2.6	7.9	RC橋	2022	1960					○						○		
K098	無名橋98	市道北方新橋線	5.8	4.5	RC橋	2021	不明				○						○			
K099	無名橋99	市道インター南線	3.2	5.4	RC橋	2022	不明					○						○		
K100	無名橋100	市道高野東西線	2.2	5.1	RC橋	2023	不明						○						○	
K101	無名橋101	市道高野東西線	4.8	7.2	RC橋	2023	不明						○						○	
K102	無名橋102	市道高野東西線	4.3	7.2	RC橋	2023	2018						○						○	
K103	無名橋103	市道高野東西線	4.8	4.0	RC橋	2023	不明						○						○	
K104	無名橋104	市道高平線	4.6	4.0	RC橋	2023	不明						○						○	
K105	馬神第1橋	市道今山馬神線	50.0	5.1	PC橋	2020	1985	2,096	ひびわれ注入工等		○						○ ◎	●		
K106	馬神第2橋	市道今山馬神線	50.0	5.1	PC橋	2020	1985	2,737	ひびわれ注入工等		○			◎	●	●	○			
合 計 (百万円)										61	54	163	192	213	201	195	141	144	140	

8.長寿命化修繕計画による効果

長寿命化修繕計画を策定する542橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の事後保全型が130億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が70億円となり、コスト削減効果は60億円となります。

また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保されます。

